


FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS

Destacables

- 4 convocatorias STR abiertas: La Marina, Atlántico, Guatapurí y Montería – Río Sinú.
- Falta garantía para iniciar convocatoria Pacífico (Buenaventura).
- **Norte 230 kV: A la espera del pronunciamiento de la Magistrada.**
- **Refuerzo Costa 500 kV:** Inicia construcción en ago/19.
- **Refuerzo Guajira 110 kV:** Nulas las tutelas que suspenden actividades. Reiniciará construcción.
- **Ituango 500 kV:** Enlace Centro-Caribe atrasado por falta de planificación del transporte de los transformadores.
- **3 trf Bosque 220/66 kV:** Suspendida consignación por fallas en la GIS.
- **Colectora:** LT Colectora – Cuestecitas con certificado de comunidades pero la empresa no avanza con consultas previas. Atrasado certificado para Cuestecitas – La Loma, programada visita para próxima semana.

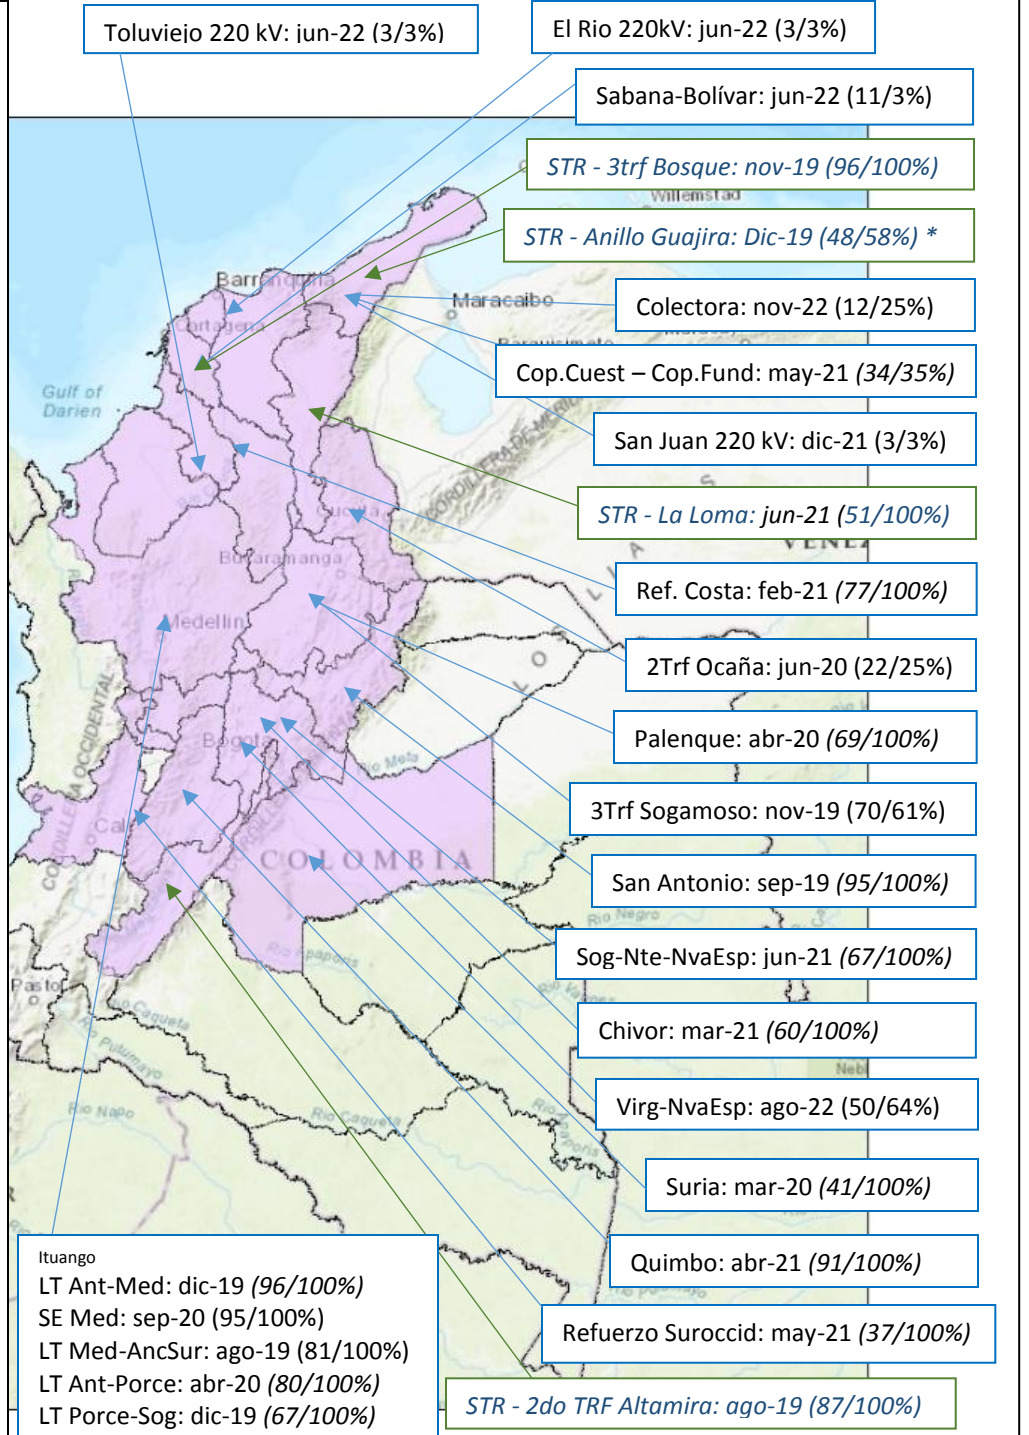

* FPO en revisión
