FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS

STR - Caracoli: En operación: 25/feb/19

STR - Norte-NvaBquilla: mar-19 (91/100%)

Ref costa: nov-21 *(73/100%)*

Colectora: nov-22 (11/14%)

STN - Bahia 3TRF Bosque: dic-18 *(86/72%)*
STR - 3trf Bosque: abr-19 (77/92%)

STR - Anillo Guajira: dic-19 (30/33%)

En operación:
Bolivar-Cartag STN: En operación 3/ago/18
Bolivar-Manzanill: En operación: 18/ago/18

STN – Bahía Valledupar: En operación: 12/feb/19
STR - 3TRF Valledupar 220/34,5 kV: En operación: 4/mar/19

Nva Montería: En operación: 27/dic/18
STR - Cereté: En operación: 23/ene/19

Cop.Cuest – Cop.Fund: nov-20 *(26/25%)*

STN - Chinú-Mont: En operación: 27/dic/18
STN - Mont-Urab: mar-19 *(97/100%)*

La Loma STN: *En operación: 22/ene/19*
STR - La Loma: sep-20 (47/100%)

Ituango
Ant-Cerr A: abr-19 *(99/100%)*
Ant-Cerr B: abr-19 *(73/100%)*

2Trf Ocaña: jun-20 (16/19%)

Palenque: sep-19 *(58/100%)*

Ituango
Ant-Med: abr-19 *(86/100%)*
Med-AncSur: may-19 (79/100%)
SE Med: oct-19 (85/100%)

3Trf Sogamoso: nov-19 (24/24%)

San Antonio: jun-19 *(87/100%)*

Ituango
Ant-Porce: oct-19 *(56/100%)*
Porce-Sog: oct-19 *(58/100%)*

Sog-Nte-NvaEsp: nov-20 *(67/100%)*

Chivor-Nte-Bac.: nov-20

Suria: dic-19 *(40/100%)*

Virg-NvaEsp: abr-22 (45/49%)

Refuerzo Suroccid: nov-20 *(36/100%)*

Armenia: jun-19 *(98/100%)*

Quimbo: jun-20 *(94/100%)*
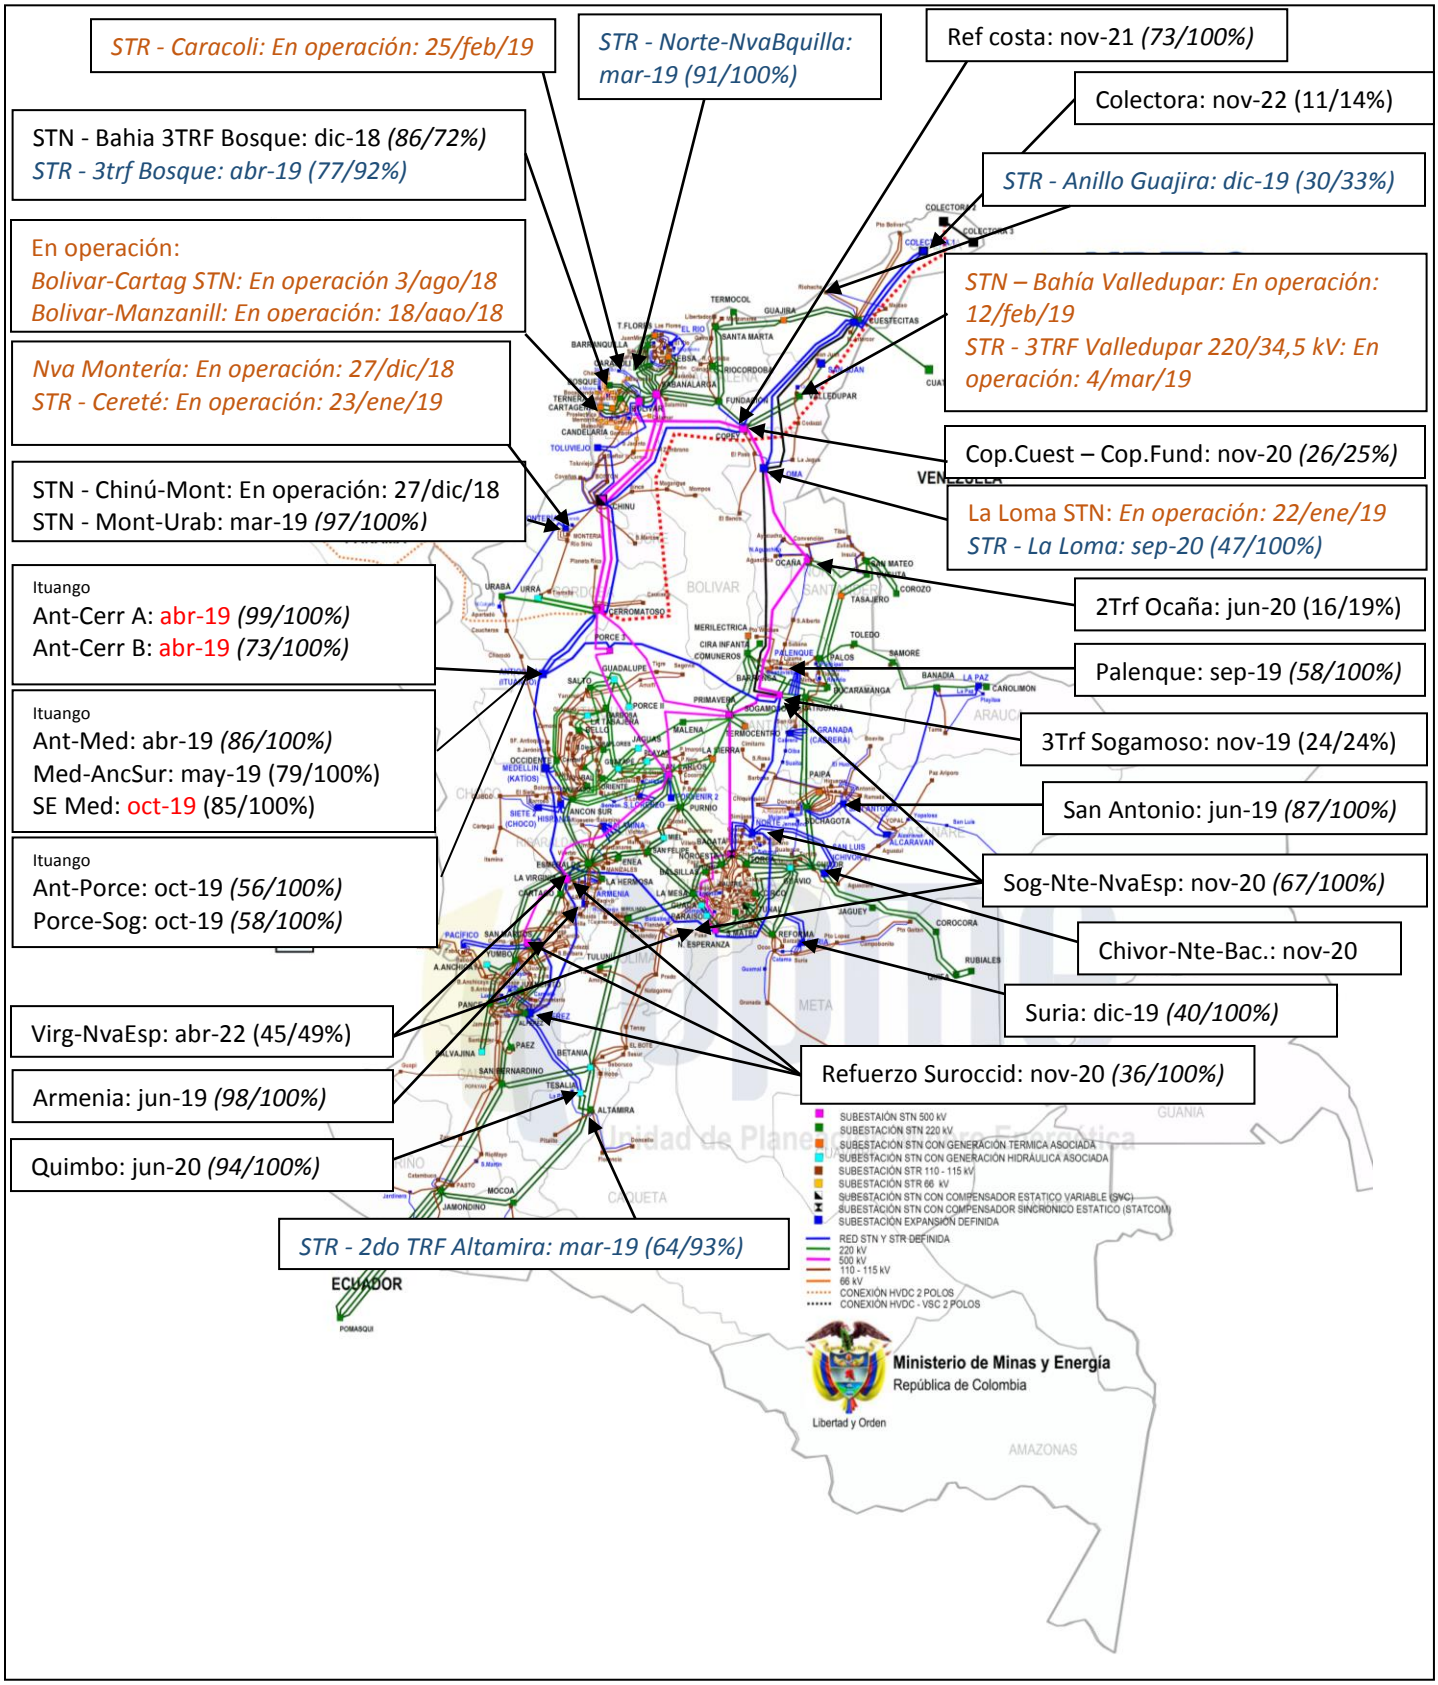
STR - 2do TRF Altamira: mar-19 (64/93%)
